



Klinikverbund
Südwest



Sachstandsbericht Zielplanung Krankenhaus Herrenberg

Sitzung PBA am 30.11.2021




Übersicht Maßnahmen

Umsetzung Zielplanung

Umsetzung Neubau Parkhaus

Verlagerung Hubschrauberlandeplatz

Übersicht Maßnahmen

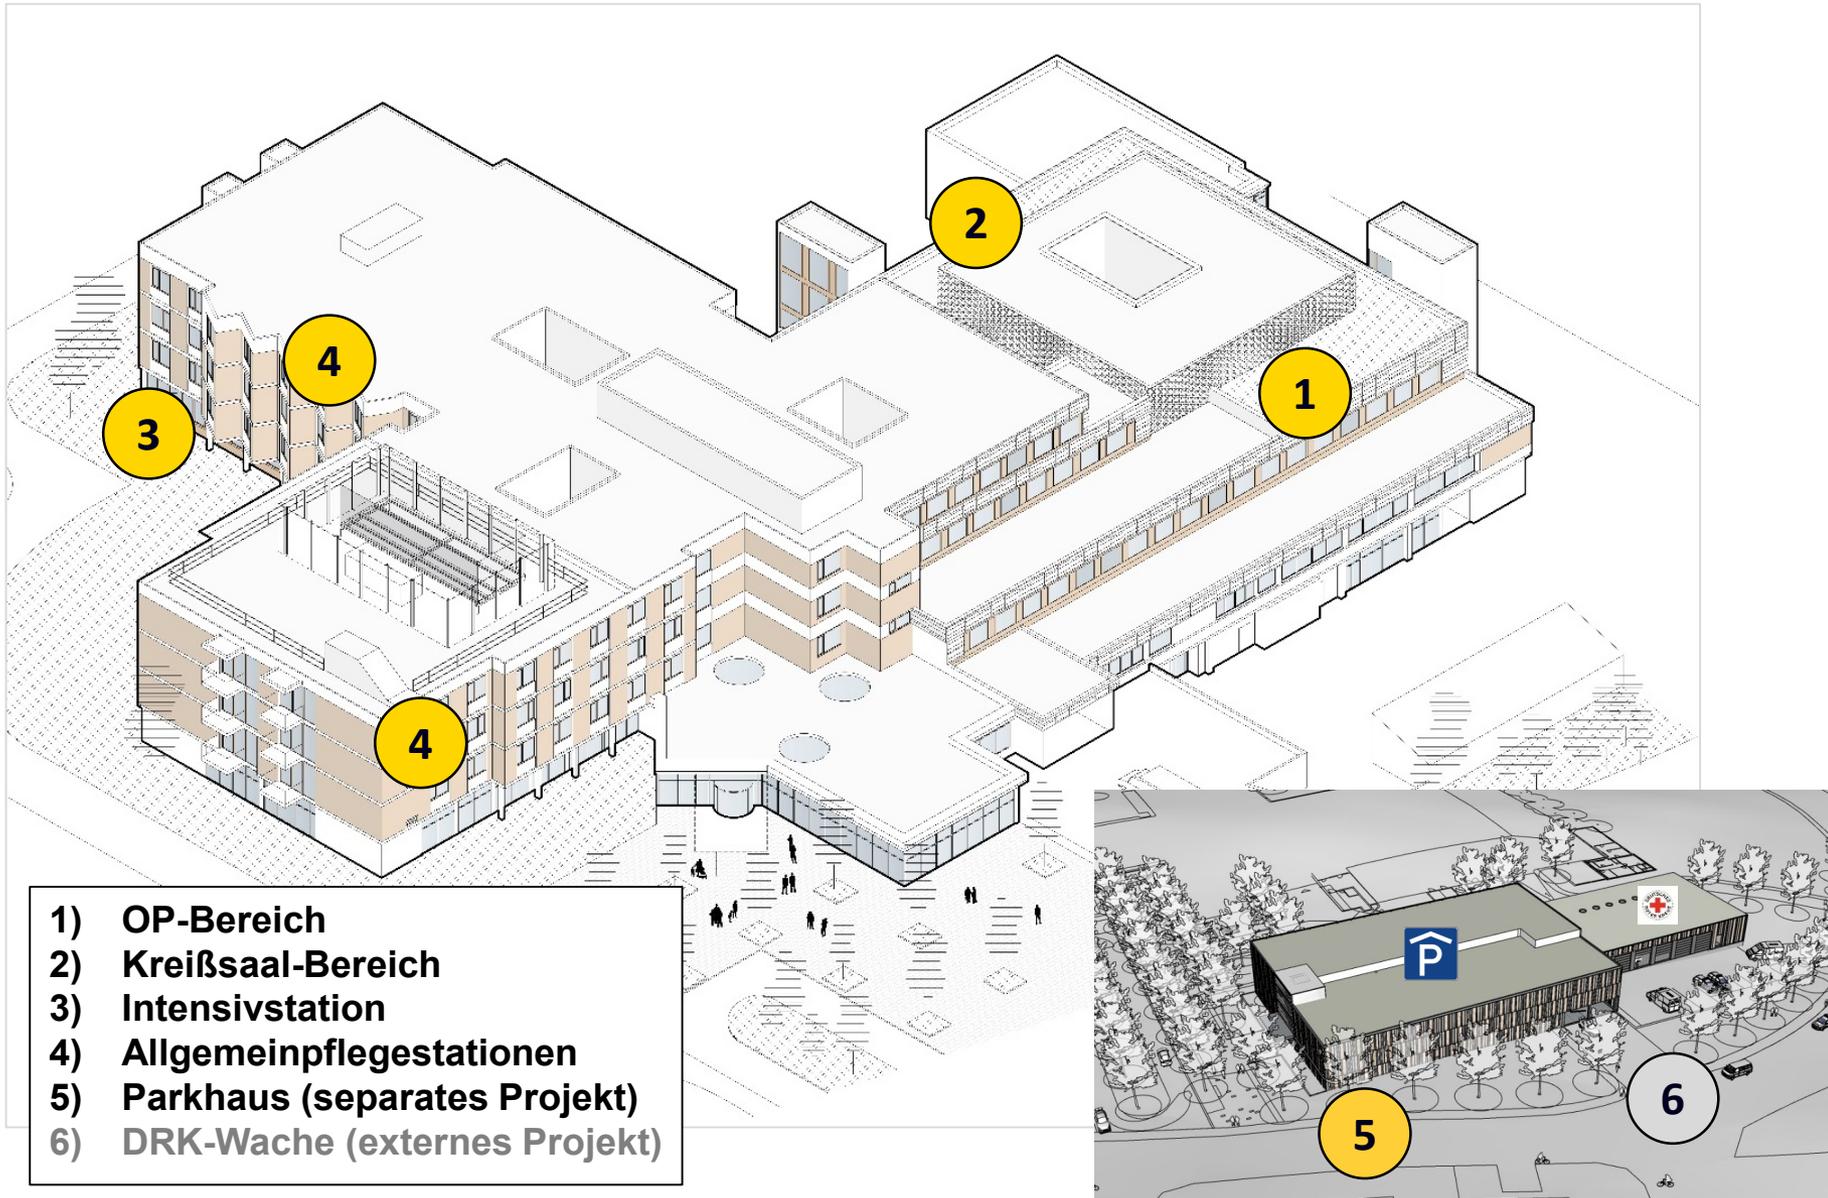



Übersicht Maßnahmen

Umsetzung Zielplanung

Umsetzung Neubau Parkhaus

Verlagerung Hubschrauberlandeplatz



Bisherige Schritte

- Entwicklung Bauablauf-Modell und Bauphasen bis 12/2020
- Beschlussfassung Optimierung Bauablauf und -phasen 01.12.2020
- Nutzerabgestimmter „Design Freeze“ der Entwurfsplanung 02/2021
- Umsetzung Leistungsphase 3 HOAI* Entwurfsplanung 08/2021
- Informationsveranstaltungen für Mitarbeiter*innen zum Planungsstand 08/09 2021
- Informativ: Inbetriebnahme neue Großgeräte Radiologie (Computer-Tomograph, konv. Röntgen, Mammografie) 08.10.2021
- Vorstellung und Beschluss Entwurfsplanung im PBA 21.09.2021
- Einreichung Förderantrag 29.10.2021


Nächste Schritte

- Erarbeitung Genehmigungsplanung Leistungsphase 4 HOAI bis 12/2021
- Einreichung Genehmigungsantrag bis 01/2022

* HOAI: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Umsetzung Zielplanung

Bauabschnittsplanung

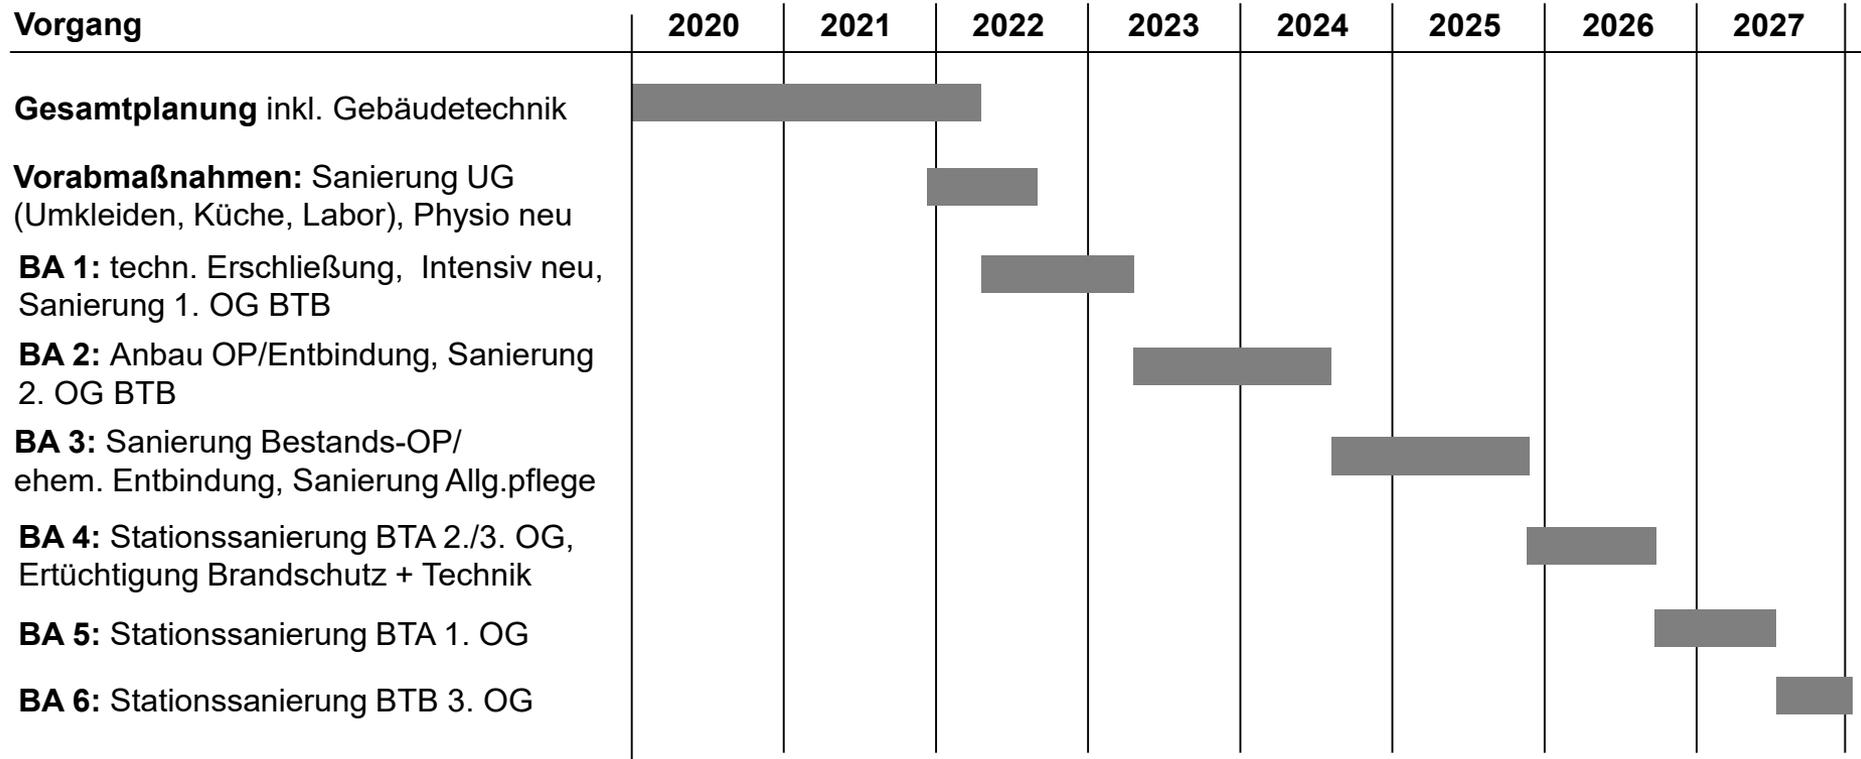

- Bauphase
- Bauphase abgeschlossen
- Verschiebung Bauphase
- Verlängerung Bauphase

Umsetzung Zielplanung Informationsveranstaltungen 12.08. und 16.09.2021



Umsetzung Zielplanung Umbau Radiologie - Gerätepark





Übersicht Maßnahmen

Umsetzung Zielplanung

Umsetzung Neubau Parkhaus

Verlagerung Hubschrauberlandeplatz




Bisherige Schritte

- Leistungsphase 2 HOAI* Vorentwurfsplanung ab 03/2020
- Variantenentwicklung Anzahl Stellplätze/Stellplatzbreiten/Rampen inkl. Kostenschätzung innerhalb Vorentwurfsplanung bis 07/2020
- Aktualisierung Varianten/Kosten und Abstimmung Außenanlagen 08-10/2020
- Freigabe Vorentwurfsplanung durch PBA und Auftrag für Entwurfsplanung mit Varianten zur Kostensenkung 01.12.2020
- Beschluss Vorzugsvariante im PBA 27.04.2021
- Fertigstellung Entwurfsplanung bis 08/2021
- Sachstandsbericht im PBA 21.09.2021
- Vorbereitung Baugenehmigung ab 09/2021
- Einreichung Bauantrag 11/2021

Nächste Schritte


- Vorbereitung Vergabeverfahren bis Ende 2021
- Laufende Abstimmung mit Planungsteam DRK fortgesetzt

Umsetzung Neubau Parkhaus Abschluss Entwurfsplanung

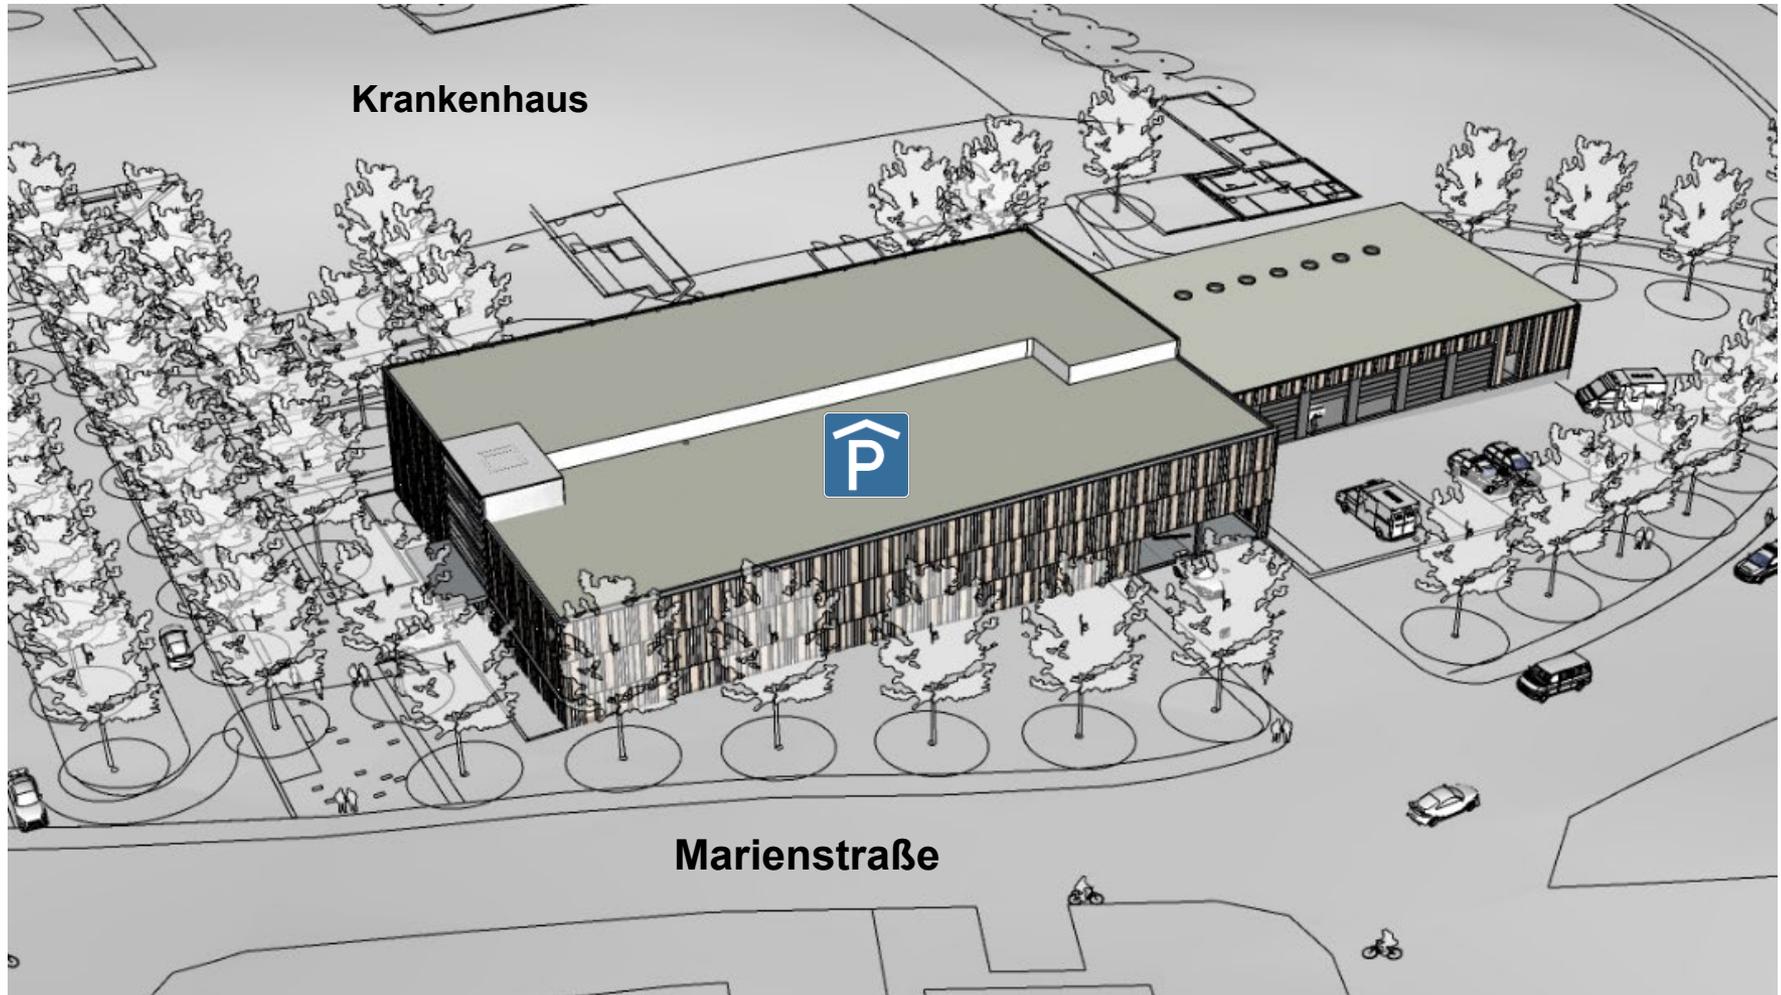


© ARCASS Planungsgesellschaft GmbH Stuttgart

Umsetzung Neubau Parkhaus Interimsparken

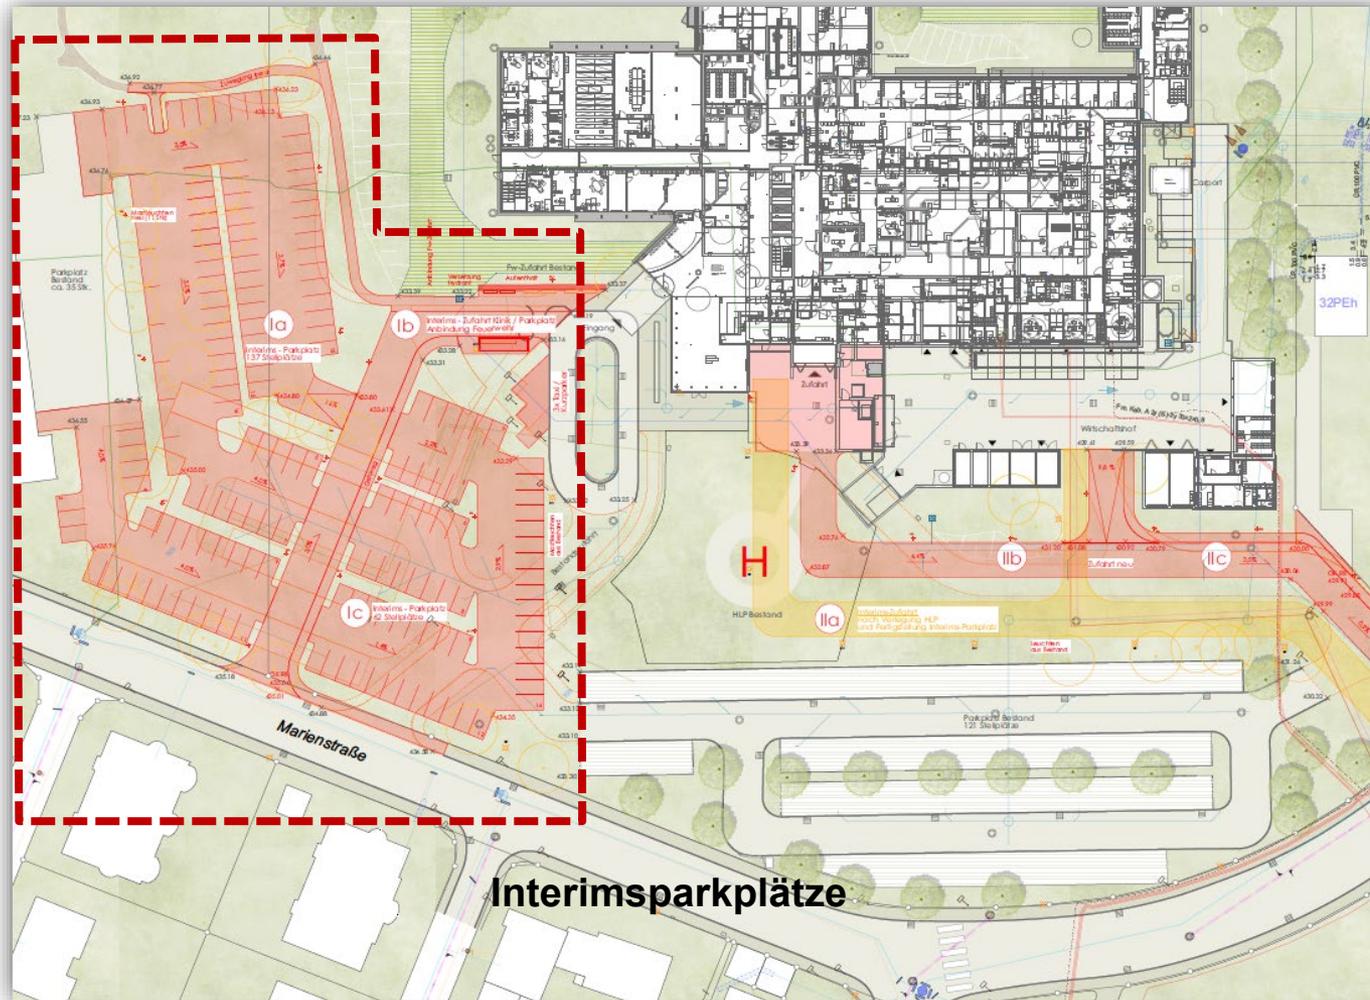

© Gänßle und Hehr, Esslingen

Umsetzung Neubau Parkhaus Rahmenterminplan

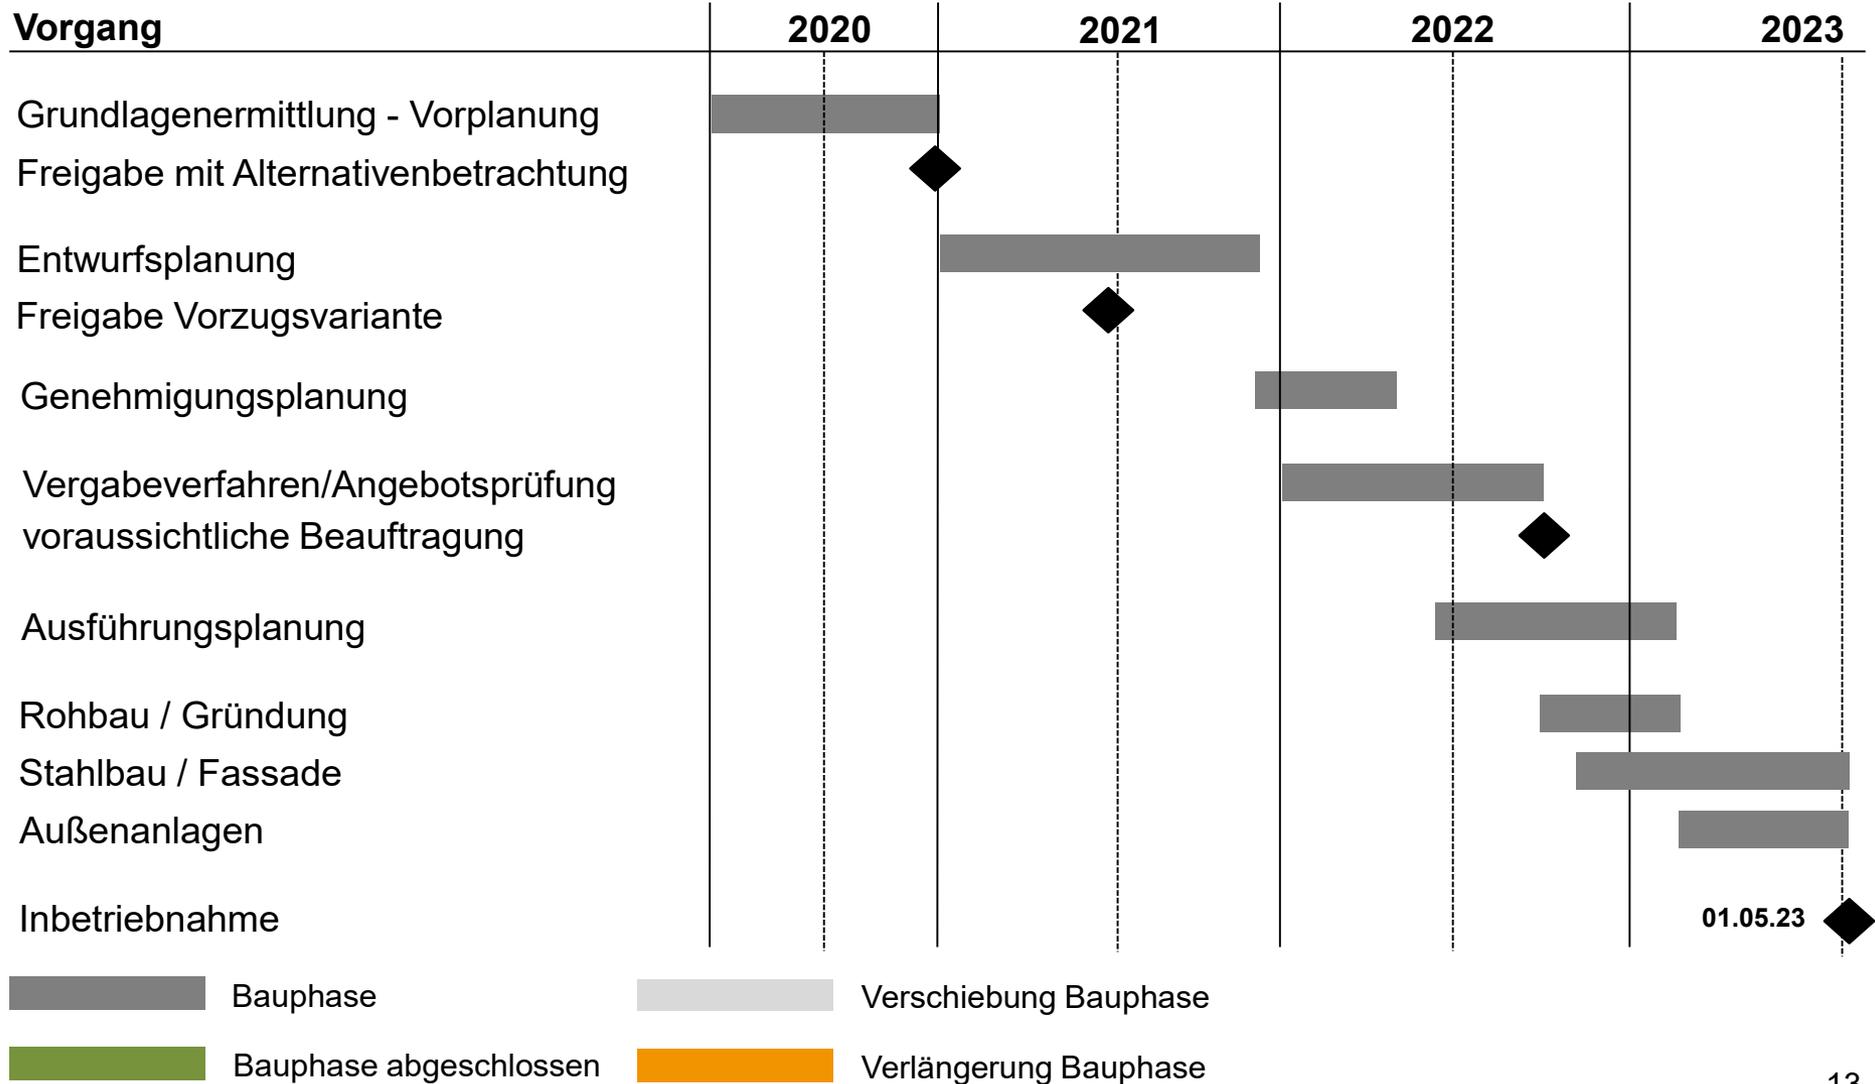



Übersicht Maßnahmen

Umsetzung Zielplanung

Umsetzung Neubau Parkhaus

Verlagerung Hubschrauberlandeplatz




Bisherige Schritte

- Leistungsphase 3 HOAI* Entwurfsplanung ab 08/2020
- Beschlussantrag Freigabe Leistungsphase 3 HOAI* Entwurfsplanung 01.12.2020
- Zurückstellung Beschlussantrag und Auftrag für: 01.12.2020
 - Prüfung Zusammenhang Hubschrauberlandeplatz und Krankenhausbetrieb am Standort Herrenberg
 - Untersuchung alternativer Landemöglichkeiten im Umfeld
- Beauftragung Beratungsbüro Teamplan für o.g. Untersuchungen 15.01.2021
- Entwicklung Ansatz zur Verlegung der PIS-Landestelle Q2/2021
- Ausarbeitung dreier Varianten und Vor-Ort-Begehung bis Mitte 07/2021
- Sachstandsbericht im PBA 21.09.2021

Nächste Schritte


- Prüfung der Variante „Süd-Östlich Tankstelle“ mit alle Beteiligten bis Ende 2021
- Einreichung Antrag bei Luftfahrtbundesamt Anfang 2022

Verlagerung Hubschrauberlandeplatz Festlegung Zielgebiet

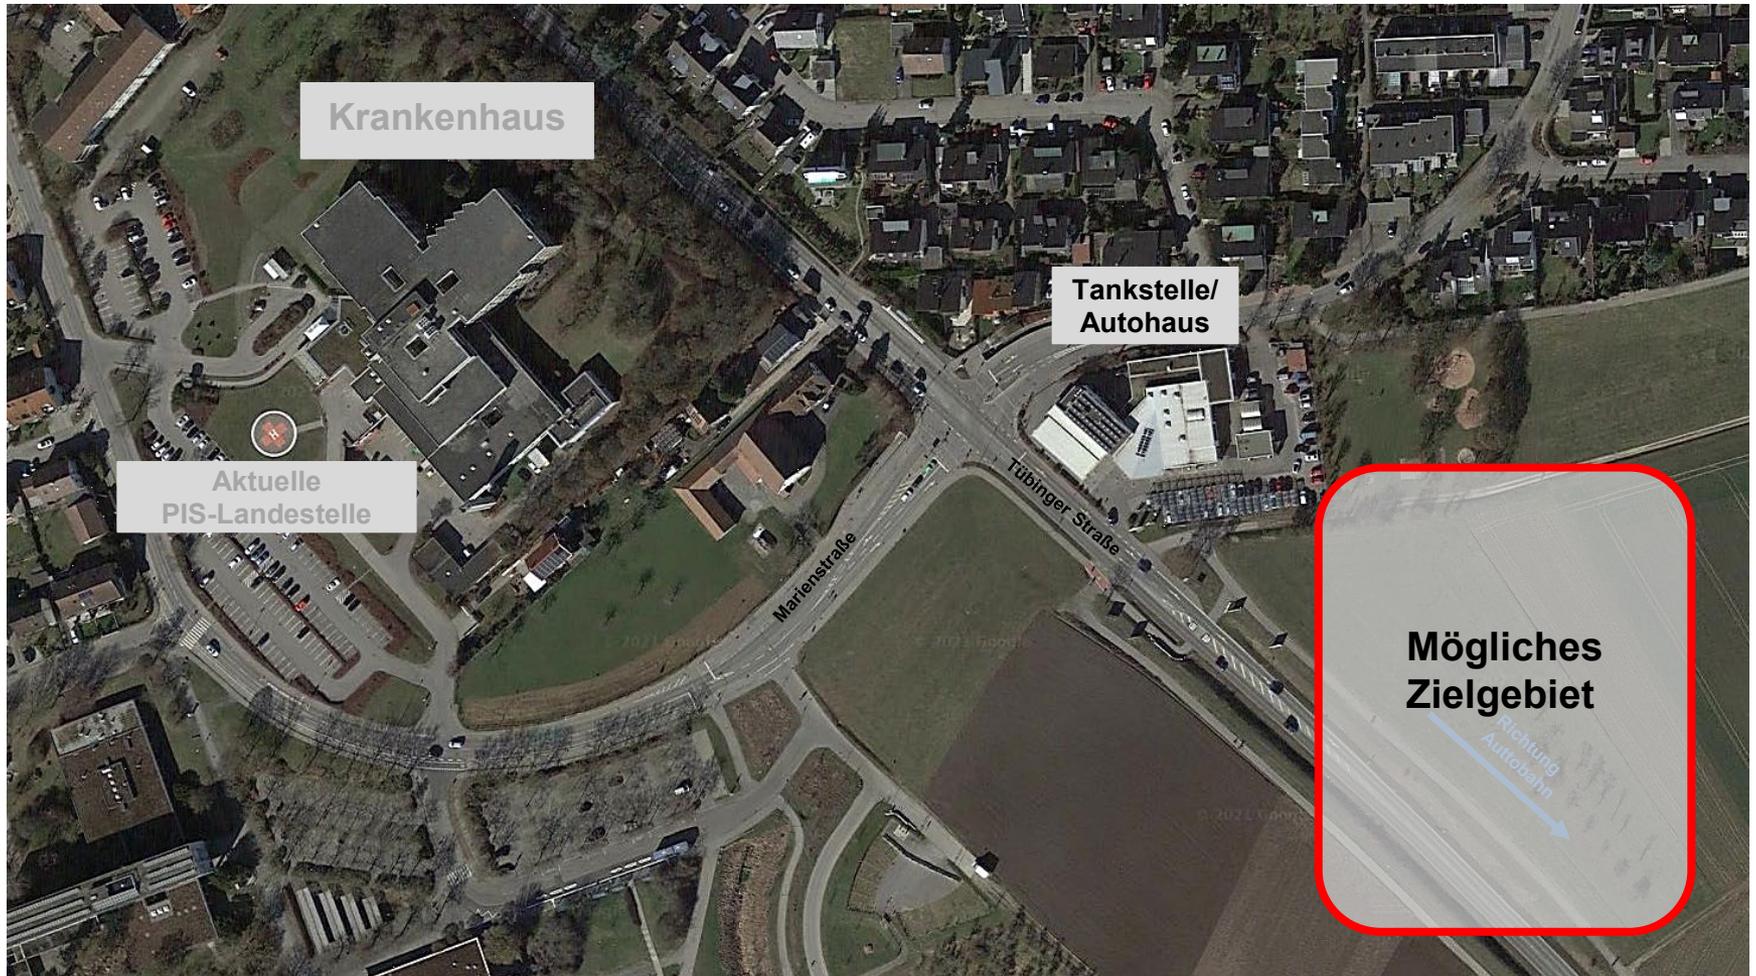

Quelle: google maps

Verlagerung Hubschrauberlandeplatz Rahmenterminplan mit Varianten

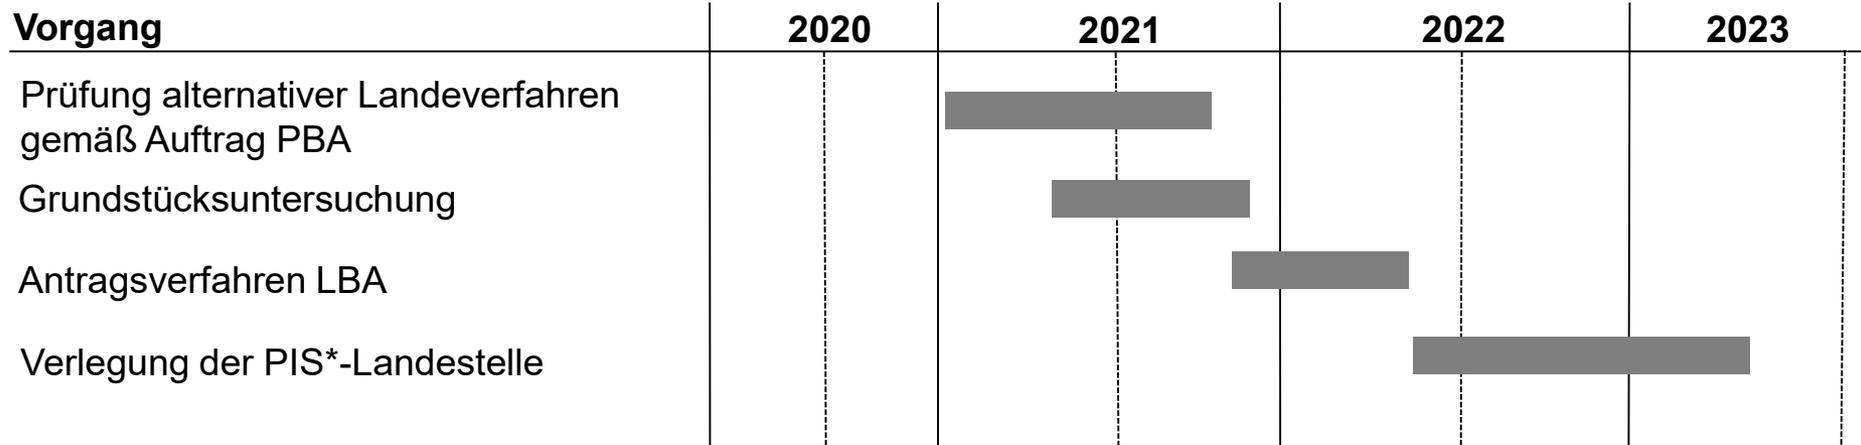

*PIS = public interest site

Die Verlegung der PIS-Landestelle kann ohne Zeitdruck erfolgen, da für die Bauphase des Parkhauses eine Interimslademöglichkeit geschaffen wurde.

- Bauphase
- Bauphase abgeschlossen
- Verschiebung Bauphase
- Verlängerung Bauphase
